



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN): U40109KA2004SGC035177
 ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,
 2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್
 ಮೈಸೂರು - 570017
 WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
 ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೇಲೂರು.
 ಫೋ.ನಂ. 08177-222223
 E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-161

ದಿನಾಂಕ : 24/3/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಬಿ.ಎಂ.ಎ.

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 24/3/2023

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಎ. - ಬಿ.ಎಂ.ಎ. ರವರ ಶೇಖರಣಾ
 ಬಿನ್/ಕೋಡ್ 13159355

ಸರ್ವೆ ನಂ 39 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
 ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಬಿ.ಎಂ.ಎ. ಹಿನ್ನಕಲ್
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 4353CL
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 90hp + pro-5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 95hp
7. ಚಕ್ರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. :..... %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5hp ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ಅಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.


- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.48 ಕಿ.ಮೀ
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : 1X25KVA ಕಿ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.24 ಕಿ.ಮೀ.

Lat - 13.159355
 Long - 76.026766

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಲಾಗುವುದು

Ch
 ಅಧಿಕಾರಿ
 24/3/2023

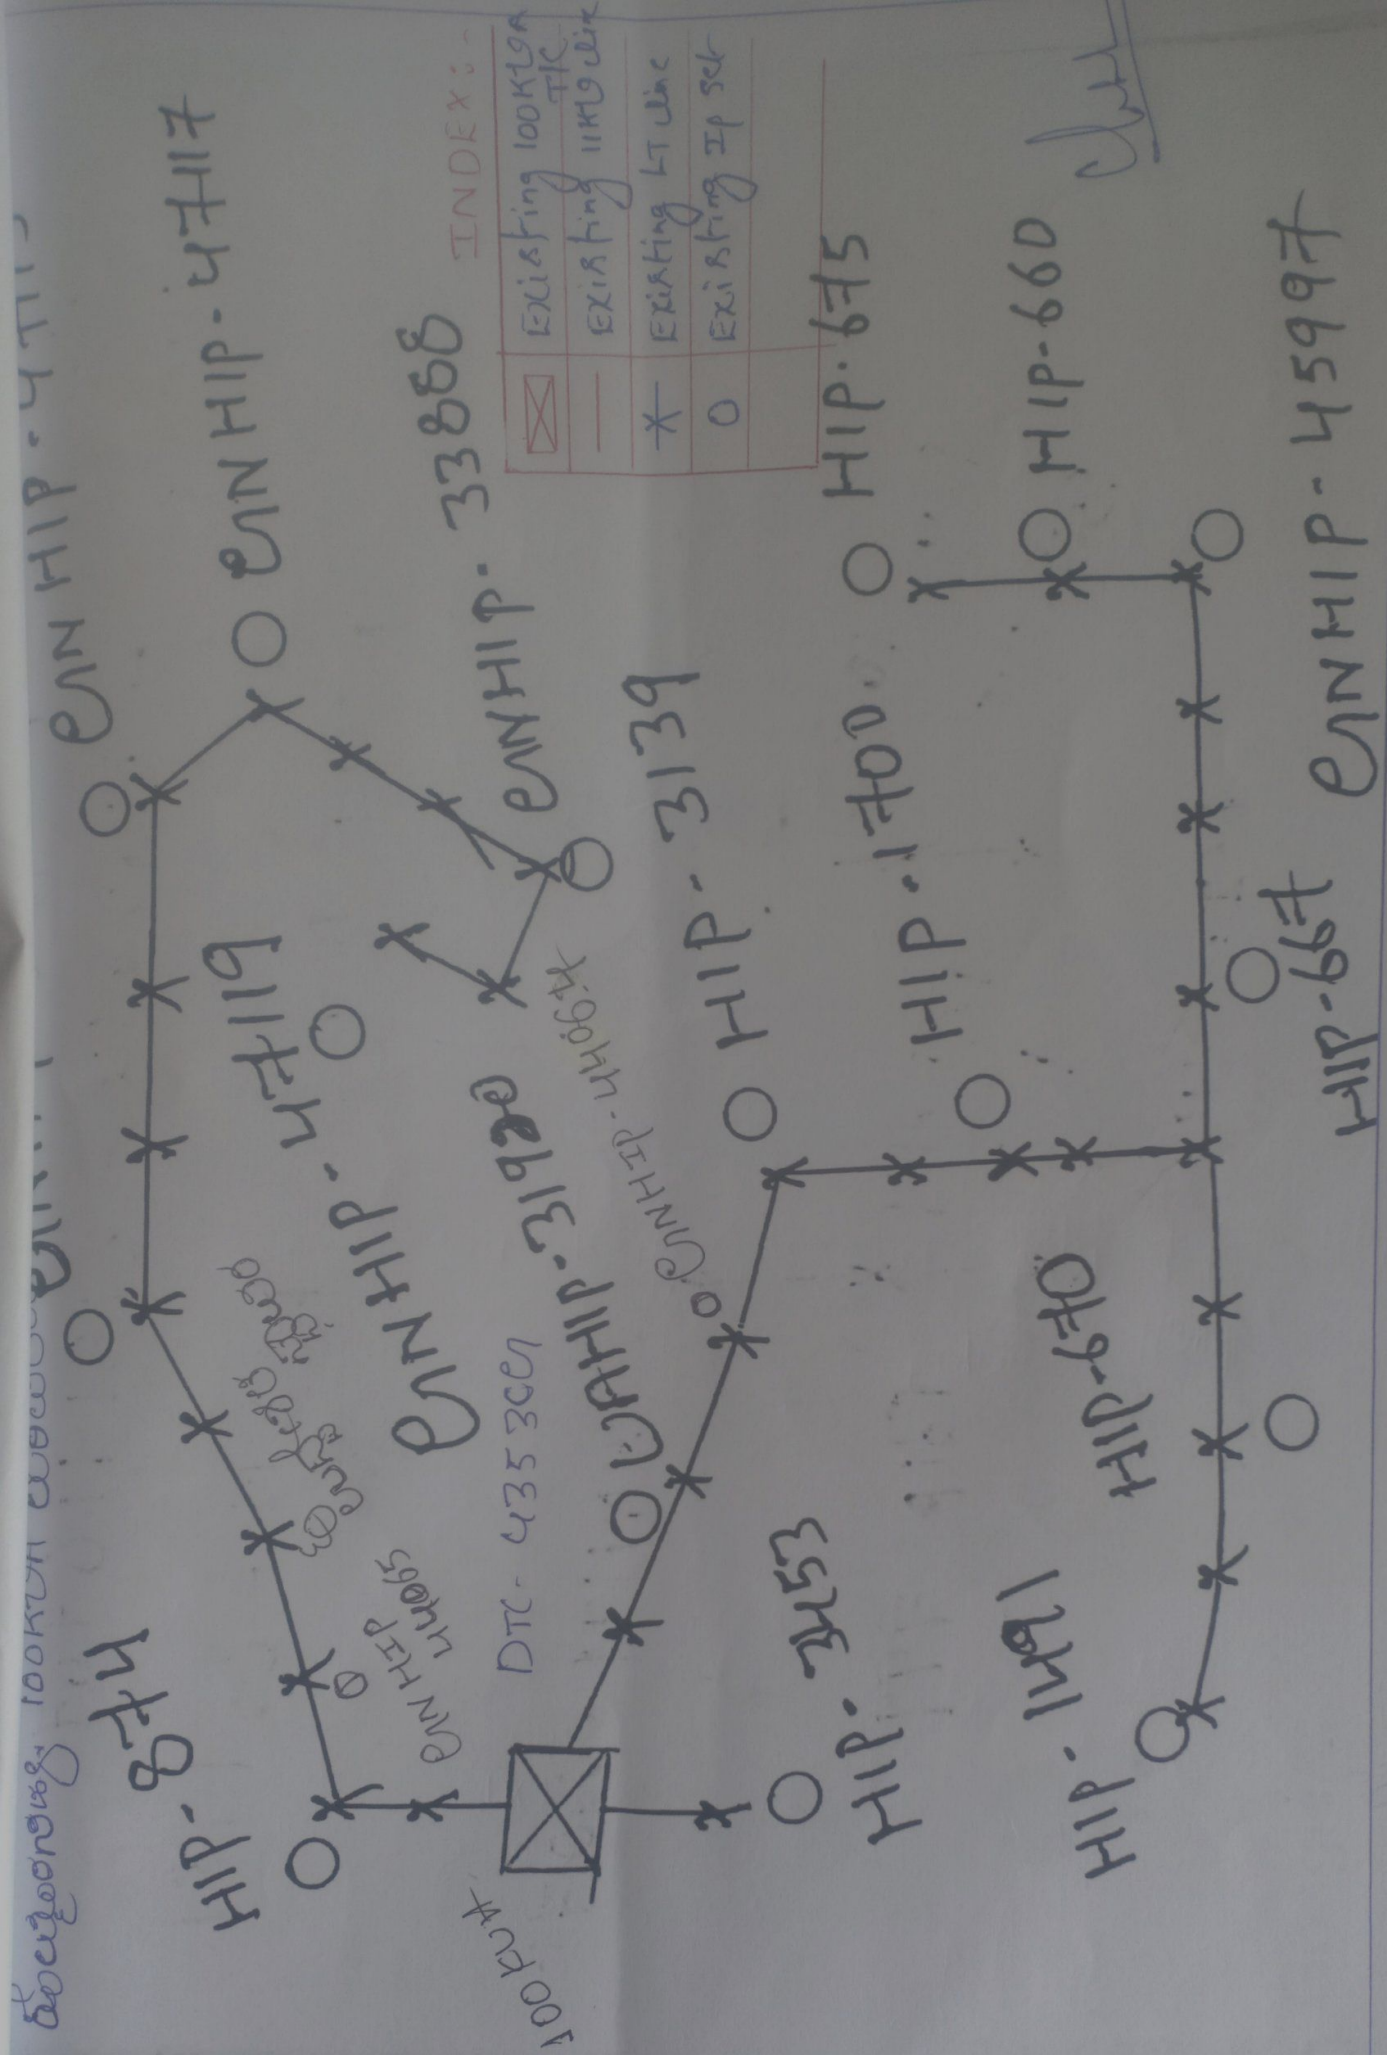

APS to OINO 5hp IP set installation in Jatropha

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14513032300916499 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-161
 ಪ್ರಮಾಣ 1510312023 ದಿನಾಂಕ 24/3/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರ 5hp ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

OINO - 1200/-

Tip Box - 330/-
 LIS - 450

ಇಲ್ಲ
 ಸಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps - 2000/-

ಷರಾ

☐
☐
☐
☐
☐

ಈ ಉಸ್ತುವಳಿ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೇ
 ಹಾಲ್ ಪ್ರಾಂಶು 1001450
 ರೇಖಾಂಕದಿಂದ ಗಾತ್ರದ ಉಸ್ತುವಳಿ
 ಉಸ್ತುವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ 935301
 DTC - 935301

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Sri. Mallikarjuna
 Sri. Uthappa
 Sri. Shivarajappa
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14513032300916499
 ದಿನಾಂಕ 24/3/2023

೧. ಭದ್ರತಾ ಲೇವರಿ ರೂ.
 ೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಲೇವರಿ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಿಡುಗಡೆ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಮಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

೨. ಮಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು

ಮೊಬಲಗು ರೂ.

೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.

ಸಾಪಕ ಸಂ. ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 ಸಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಮರ್ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪೂಸ್
 ಲೋಡಿಂಗವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
 ಫೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ವಿವರ ಒದಗಿಸಿ

ಸುರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಸಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ವಿವರ ಒದಗಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

- ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
- ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
- ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
- ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
- ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ

ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕುಟುಂಬ ಮೊಹರ್)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕುಟುಂಬ ಮೊಹರ್)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕುಟುಂಬ ಮೊಹರ್)
